




PICK UP | 1階の躯体工事を行っています

6月に入り、梅雨の季節を迎えました。雨の日が増え、蒸し暑さを感じる時期となります。雨や気温の変化が大きい時期ではありますが、安全管理を徹底し、近隣の皆様への配慮を心がけながら工事を進めてまいります。

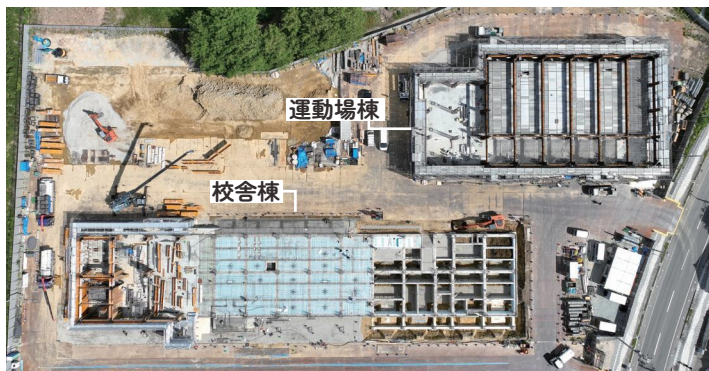


2026年6月現在の現場の様子

校舎棟、屋内運動場棟ともに、1階の工事に入りました。特に運動場棟では、鉄骨工事が最初の工程となるため、建物のスケール感が少しずつ見えてきています。昨今の社会情勢による影響もある中ではありますが、管理を徹底し安全第一で工事を進めています。



鉄骨建て方

屋内運動場では、工場で製作した柱や梁の部材を現場へ搬入して、大型のクレーンで組み立てていきます。鉄骨の水平垂直の組み立て精度が、建物全体の精度に繋がるため、非常に重要な作業です。

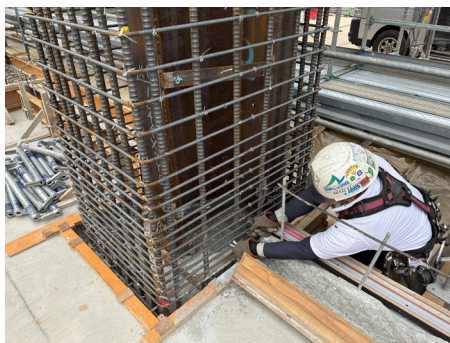

鉄筋組立

校舎棟では、1階部分の工事の最初の工程として、鉄筋組立を行います。柱→梁→上階の床の順に組み上げながら、建物の骨格となる構造をつくっています。



型枠組立

基礎同様にコンクリートを打ち込む型枠を組み立てていきます。高所での作業が増えるため安全に注意しながら進めています。

check

全国安全週間とは

全国安全週間がはじまります

【準備期間】6月1日～6月30日 / 【本週間】7月1日～7月7日

職場で労働災害防止と安全意識向上を目的として、厚生労働省などが主唱するキャンペーンです。



安全パトロールで危険個所を徹底的になくしています

熱中症対策も各現場でキットを設置しています

これからも安全管理を徹底し無事故で工事を行います！


安全標語を
のぼり旗にして、
現場に設置しています



今回紹介するのは

現場監督 / 千歳建設

菊地 主任技術者



No.
03

【わたしたちがつくっています！】

現場スタッフ紹介コーナー

施工図をチェック中

現場では、主に屋内運動場棟の施工図の確認や修正業務を行っています。業務の中心は机上での作業となります。施工図とは、設計図をもとに実際の工事を進めるために必要な寸法や施工方法などを、詳細に反映した図面のことです。作成した施工図は各協力業者へ共有され、部材の加工や現場での組立てに活用されます。現場の納まりまで考慮しながら調整を行うため、非常に繊細な作業です。



Q1

休日の楽しみは何ですか？

プラモデルや金属製モデルをつくることです。

Q2

趣味は何ですか？

プラモデルや金属製モデルをつくること。風景写真撮影やアマチュア無線をすることも。

Q3

最後に一言お願いします！

お客様から喜ばれる建物をつくります！完成までよろしくお願いいたします。

先日、インターンシップに参加してくださった学生さんと一緒に、大石田小学校建築工事の現場にて実習を行いました。初めて見る大規模な工事現場で、現場監督の仕事内容や現場での役割について学んでいただきました。今後も大石田小学校の現場にて実習を受け入れる予定です。



大石田小学校の現場

広報は見た！

今後の工事スケジュール

	2026 年 6 月	7 月	8 月
校舎棟	1 階 基礎工事	1 階 床工事	1 階 躯体工事
屋内運動場	1 階 鉄骨工事	1 階 床工事	1 階 躯体工事
			2 階 躯体工事

発行人 市村工務店・千歳建設 特定建設工事共同企業体 / (株)タカハシ電工 / 黒澤建設工業(株)

【建築主体工事】

(株)市村工務店



〒990-2482

山形県山形市久保田 3 丁目 11-12

TEL : 023-644-6878

【建築主体工事】

(株)千歳建設



〒990-2345

山形県山形市富神台 15

TEL : 023-647-1511

【電気設備工事】

(株)タカハシ電工



〒990-0850

山形県山形市くぬぎざわ西 4-1

TEL : 023-644-1666

【機械設備工事】

黒澤建設工業(株)



〒990-0067

山形県山形市花楸 2 丁目 9-21

TEL : 023-623-4222
